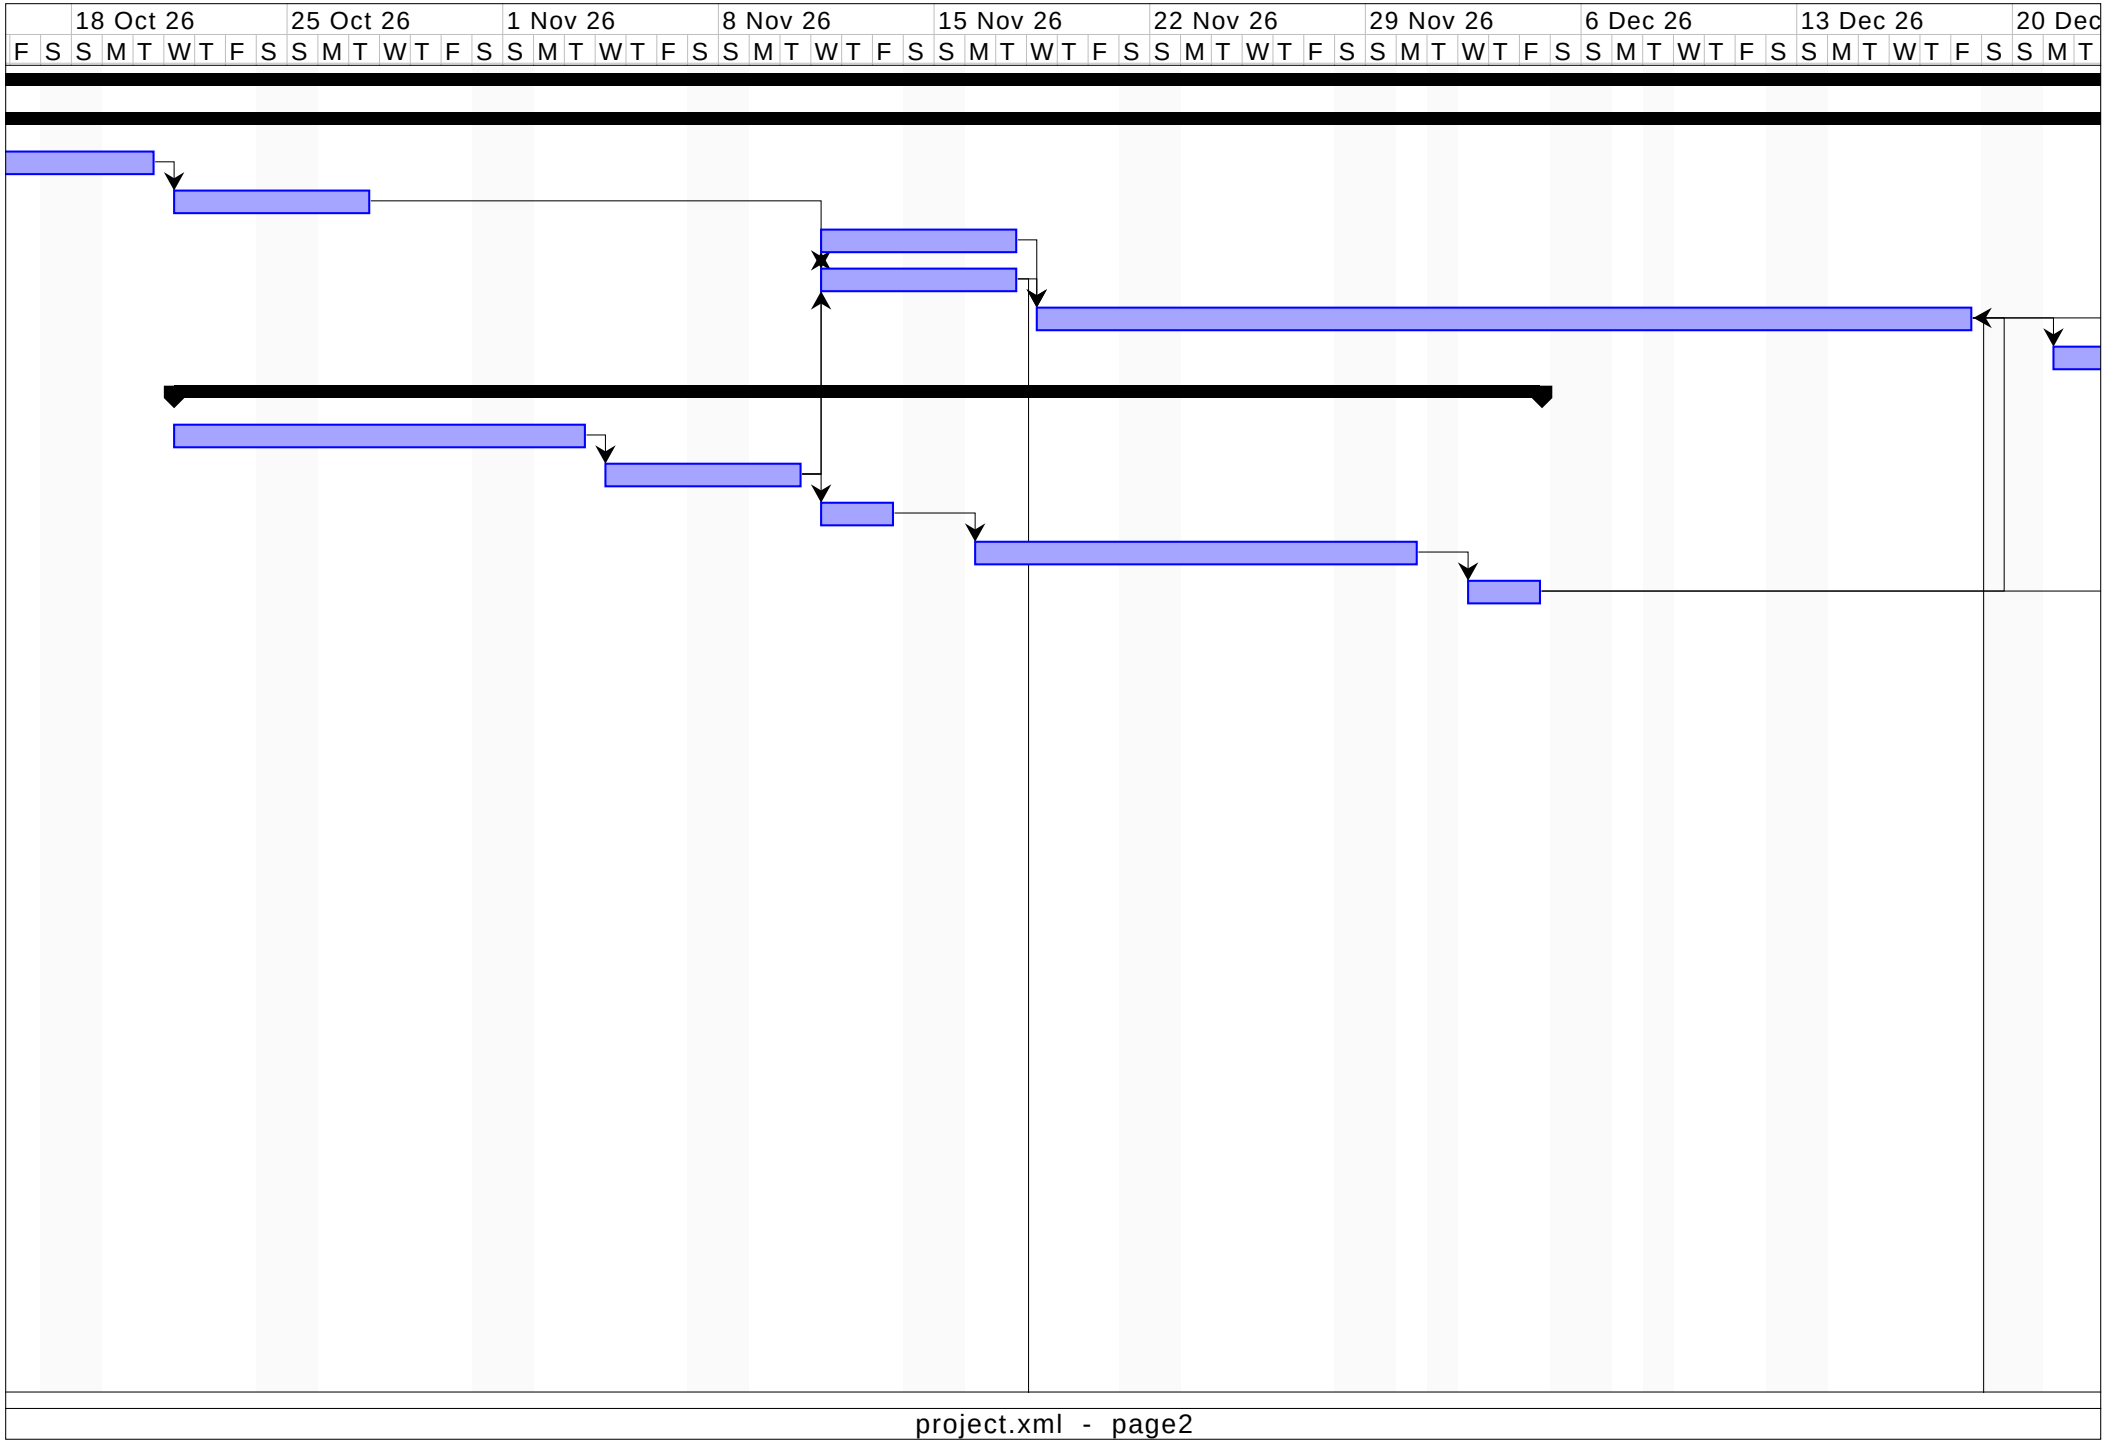
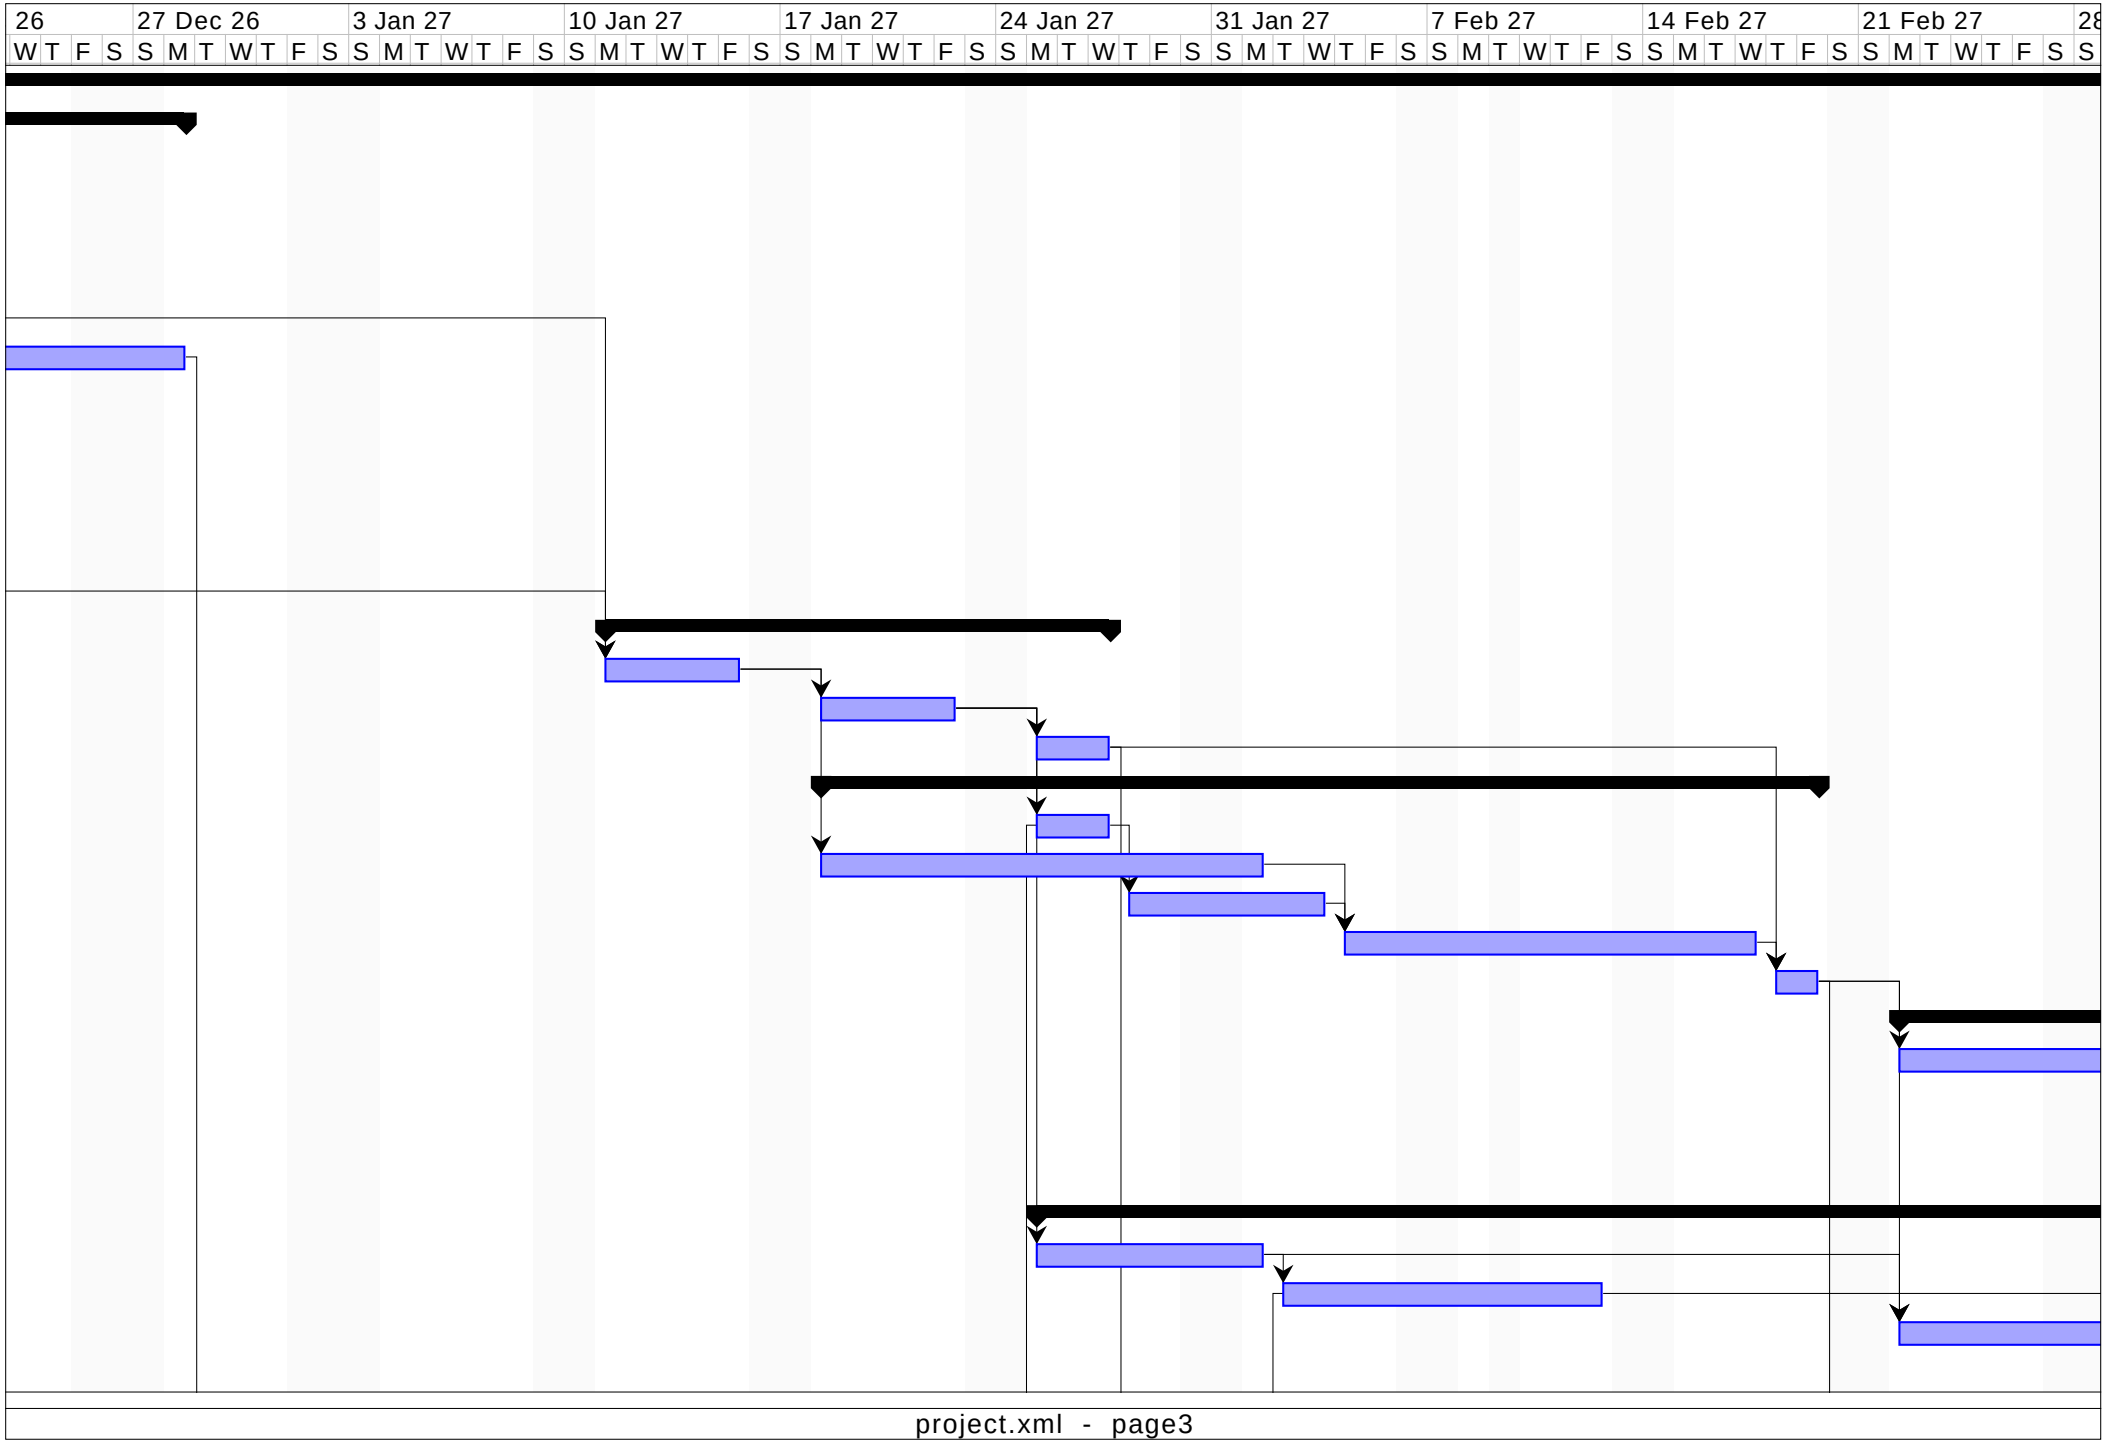
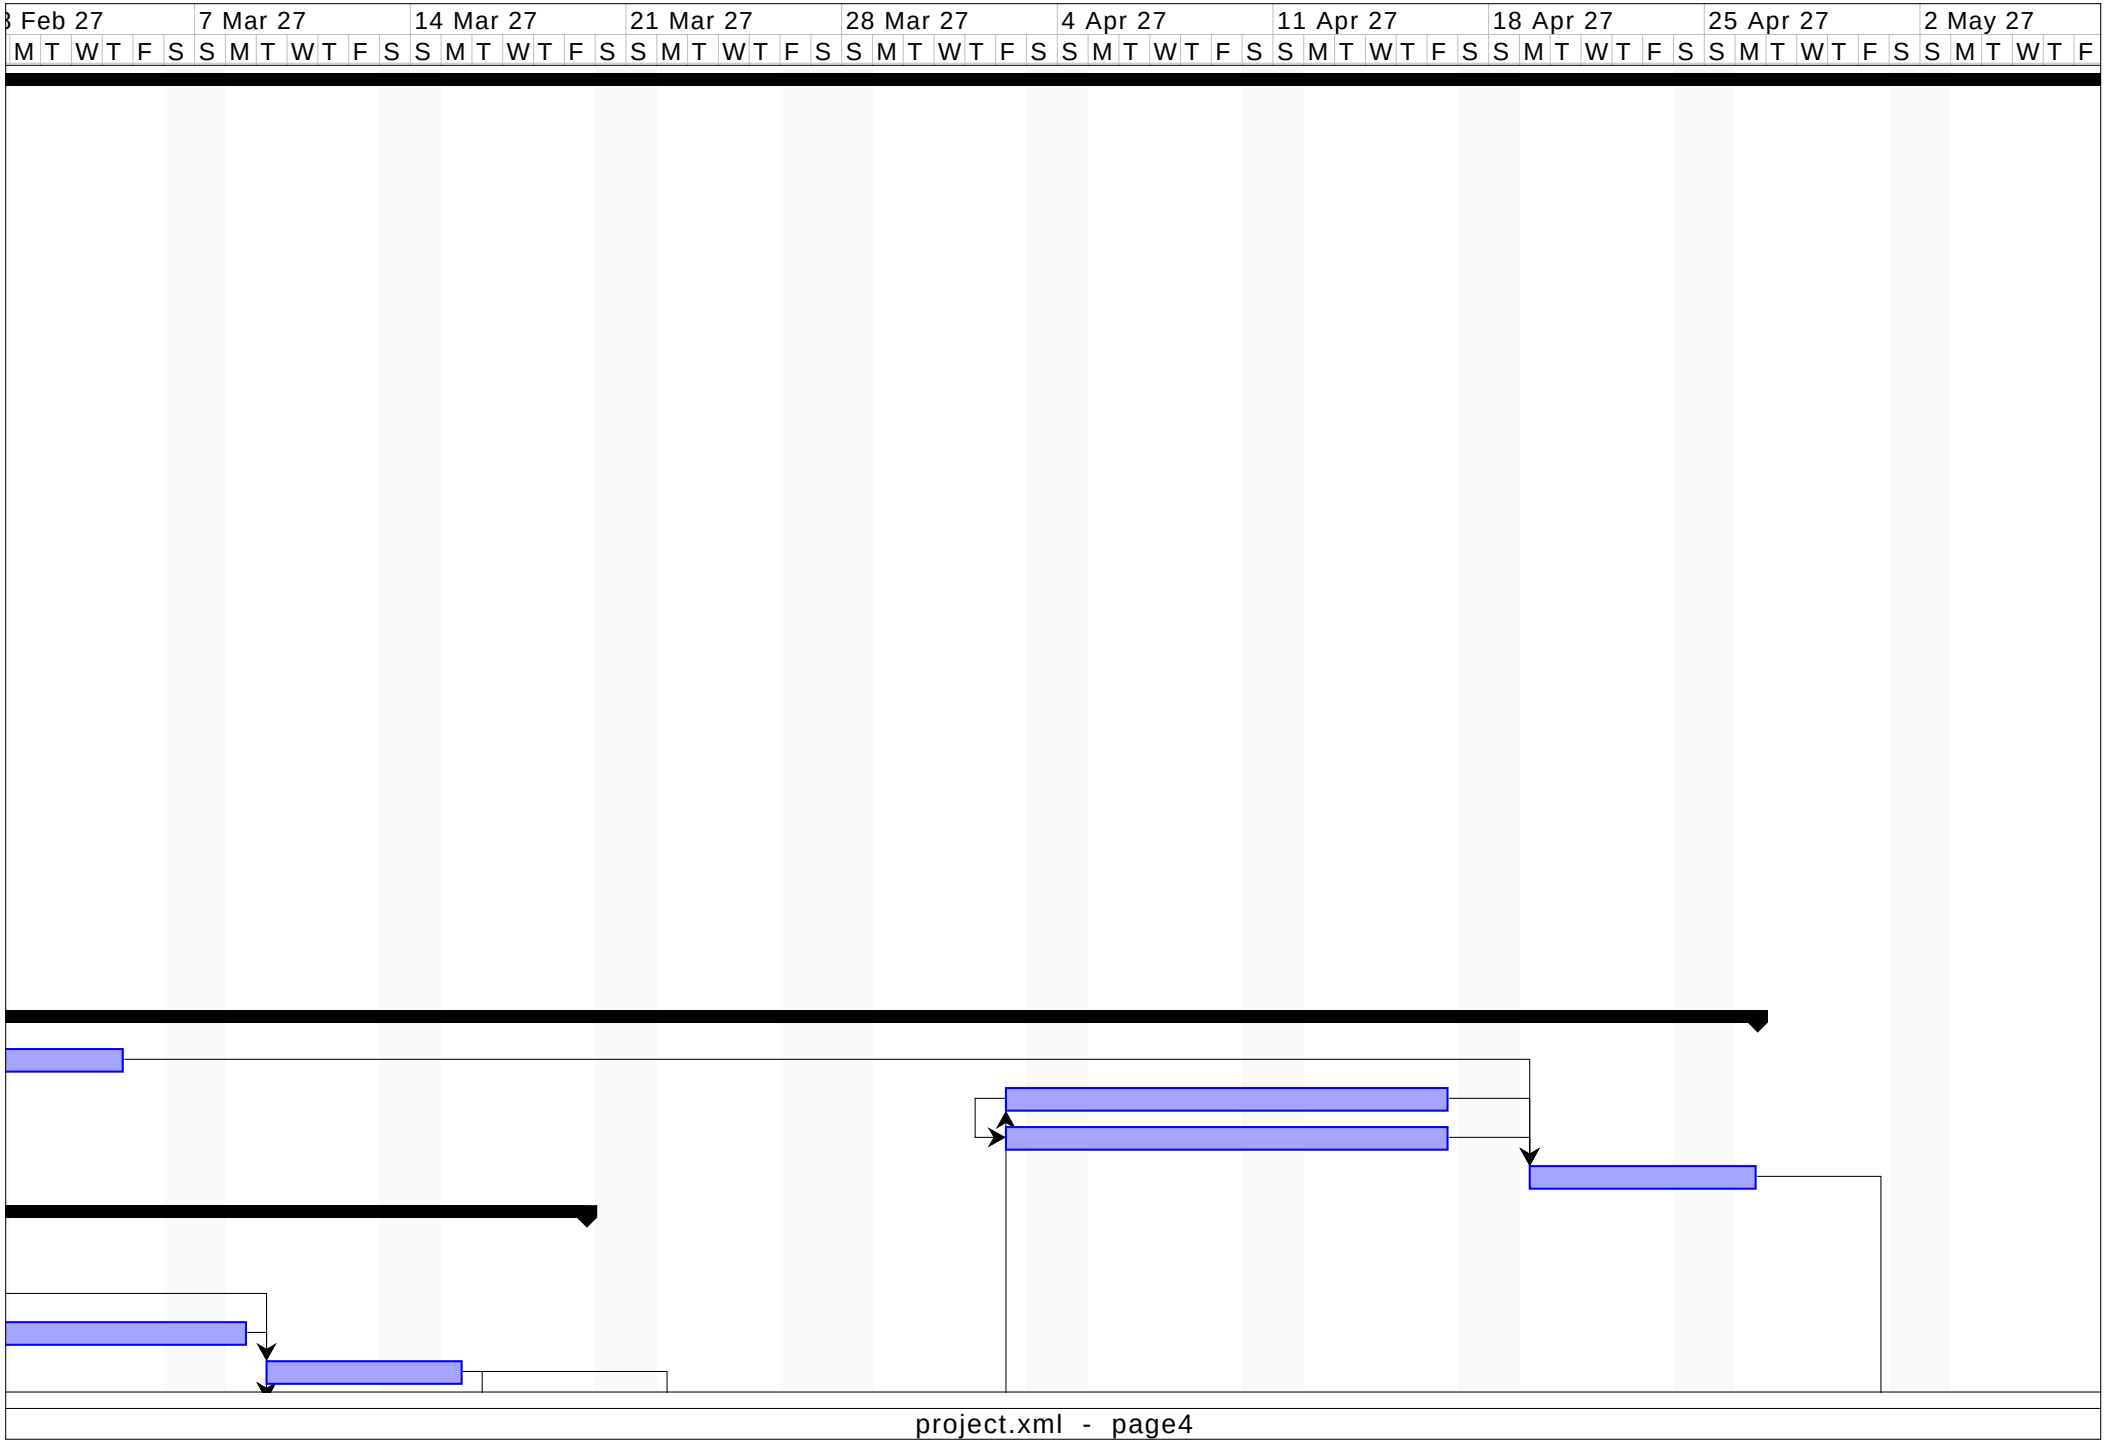
		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	11 Oct 26 S M T W T
1		**Projeto Dissertação (...**	**150 days**	**10/14/26, 8:00AM**	**5/20/27, 5:00PM**			
2		**Documento de PRE...**	**51 days**	**10/14/26, 8:00AM**	**12/28/26, 5:00PM**			
3		Problema, objetivo...	5 days	10/14/26, 8:00AM	10/20/26, 5:00PM			
4		Proposta metodoló...	5 days	10/21/26, 8:00AM	10/27/26, 5:00PM	3		
5		Planeamento (EAP ...	5 days	11/11/26, 8:00AM	11/17/26, 5:00PM	11		
6		Extended abstract	5 days	11/11/26, 8:00AM	11/17/26, 5:00PM	4;11		
7		Documento final	21 days	11/18/26, 8:00AM	12/18/26, 5:00PM	5;6;14FF+5 days		
8		Apresentação	5 days	12/21/26, 8:00AM	12/28/26, 5:00PM	7		
9		**Revisão sistemátic...**	**32 days**	**10/21/26, 8:00AM**	**12/4/26, 5:00PM**			
10		Protocolo da revisão	10 days	10/21/26, 8:00AM	11/3/26, 5:00PM			
11		Pesquisa e seleção...	5 days	11/4/26, 8:00AM	11/10/26, 5:00PM	10		
12		Avaliação da quali...	3 days	11/11/26, 8:00AM	11/13/26, 5:00PM	11		
13		Extração e síntese	11 days	11/16/26, 8:00AM	11/30/26, 5:00PM	12		
14		Lacuna de investig...	3 days	12/2/26, 8:00AM	12/4/26, 5:00PM	13		
15		**Requisitos**	**13 days**	**1/11/27, 8:00AM**	**1/27/27, 5:00PM**			
16		Levantamento com...	5 days	1/11/27, 8:00AM	1/15/27, 5:00PM	7;14		
17		Requisitos funcion...	5 days	1/18/27, 8:00AM	1/22/27, 5:00PM	16		
18		Critérios de aceita...	3 days	1/25/27, 8:00AM	1/27/27, 5:00PM	17		
19		**Análise experiment...**	**24 days**	**1/18/27, 8:00AM**	**2/19/27, 5:00PM**			
20		Modelos candidato...	3 days	1/25/27, 8:00AM	1/27/27, 5:00PM	17		
21		Conjunto de teste	11 days	1/18/27, 8:00AM	2/1/27, 5:00PM	16		
22		Prompt e campos ...	5 days	1/28/27, 8:00AM	2/3/27, 5:00PM	20		
23		Resultados compa...	9 days	2/4/27, 8:00AM	2/17/27, 5:00PM	21;22		
24		Escolha do modelo...	2 days	2/18/27, 8:00AM	2/19/27, 5:00PM	23;18		
25		**Avaliação**	**45 days**	**2/22/27, 8:00AM**	**4/26/27, 5:00PM**			
26		Avaliação por espe...	9 days	2/22/27, 8:00AM	3/4/27, 5:00PM	24		
27		Questionário a utili...	11 days	4/2/27, 8:00AM	4/16/27, 5:00PM	40		
28		Latência e custo e...	11 days	4/2/27, 8:00AM	4/16/27, 5:00PM	27SS		
29		Análise de resulta...	6 days	4/19/27, 8:00AM	4/26/27, 5:00PM	26;27;28		
30		**Assistente implem...**	**39 days**	**1/25/27, 8:00AM**	**3/19/27, 5:00PM**			
31		Arquitetura e integ...	6 days	1/25/27, 8:00AM	2/1/27, 5:00PM	17		
32		Interface de conve...	8 days	2/2/27, 8:00AM	2/12/27, 5:00PM	31		
33		Serviço de convers...	11 days	2/22/27, 8:00AM	3/8/27, 5:00PM	31;24		
34		**Verificação e testes**	5 days	3/9/27, 8:00AM	3/15/27, 5:00PM	33		

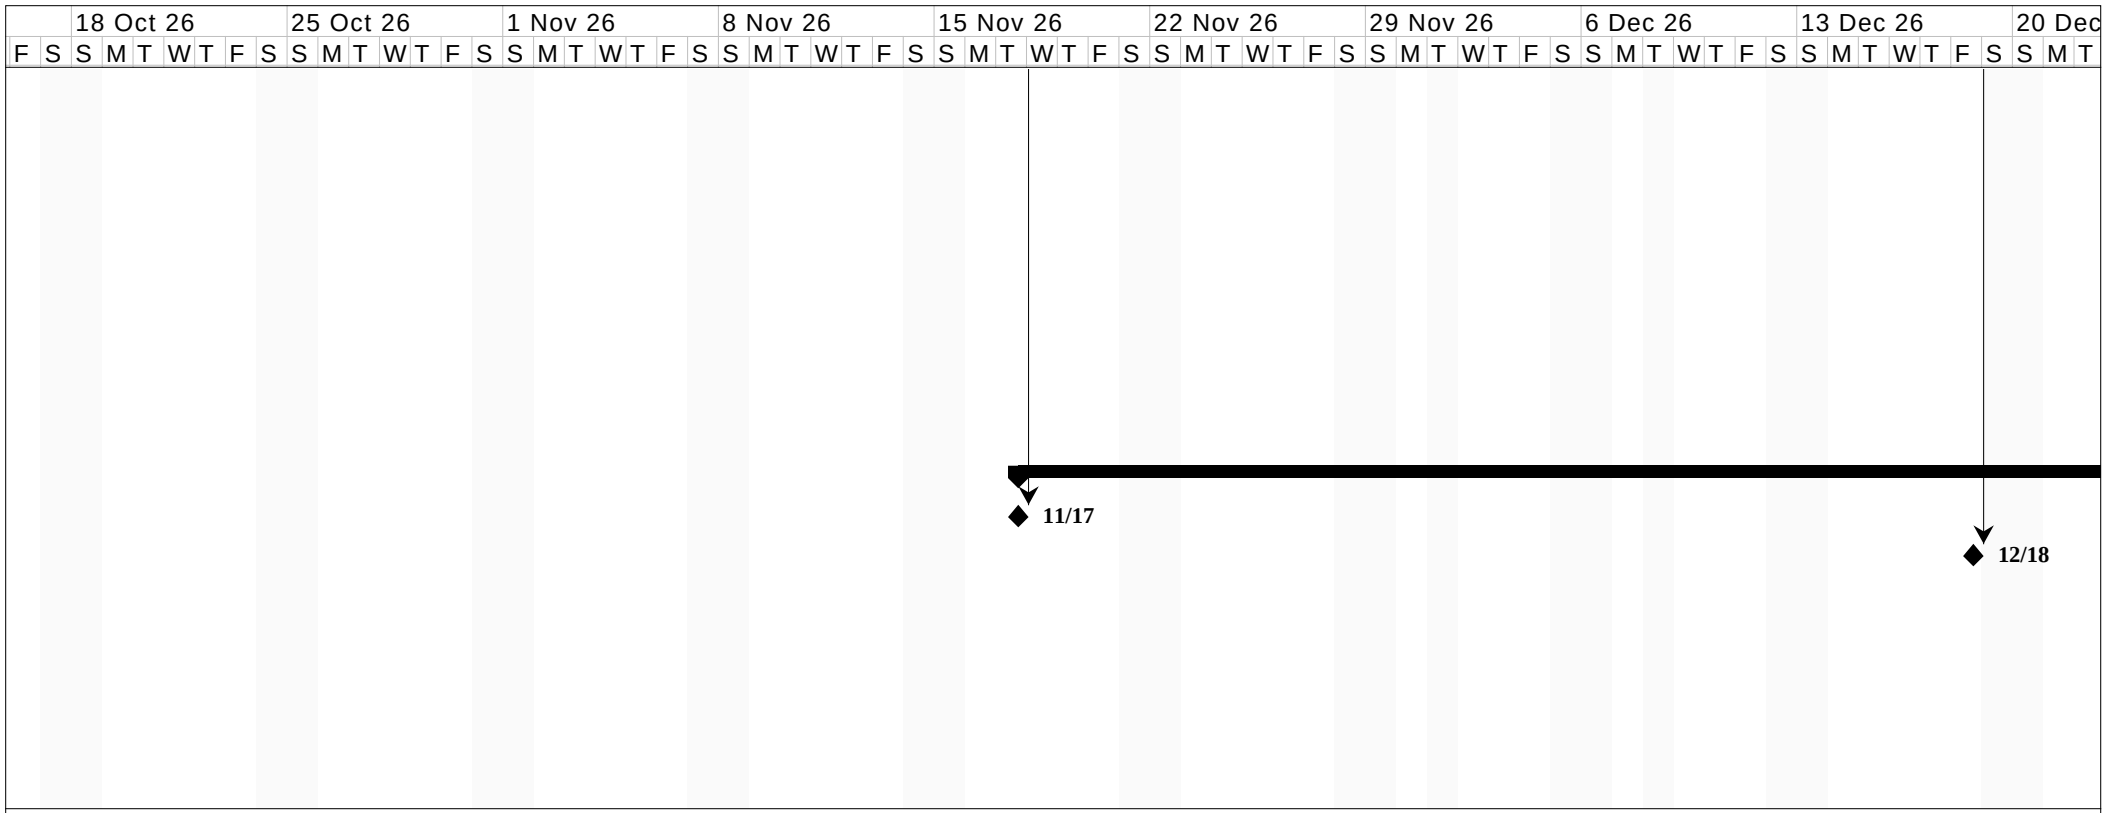

18 Oct 26
25 Oct 26
1 Nov 26
8 Nov 26
15 Nov 26
22 Nov 26
29 Nov 26
6 Dec 26
13 Dec 26
20 Dec
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

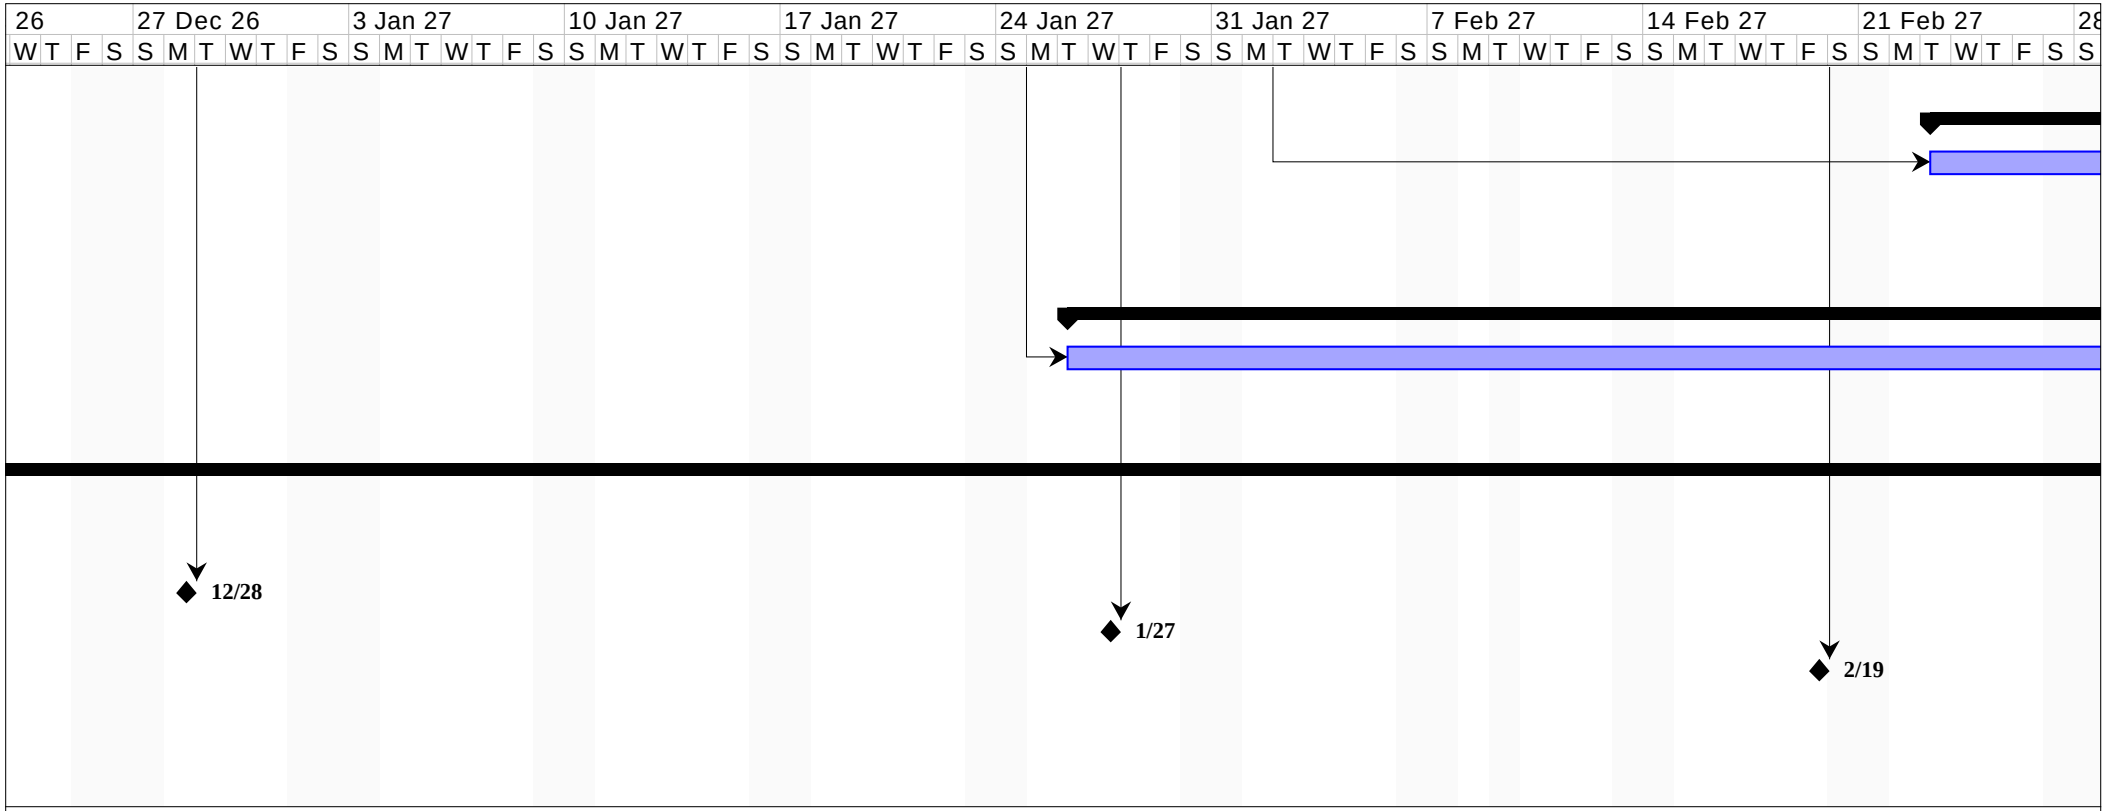

26
27 Dec 26
3 Jan 27
10 Jan 27
17 Jan 27
24 Jan 27
31 Jan 27
7 Feb 27
14 Feb 27
21 Feb 27
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
project.xml - page3

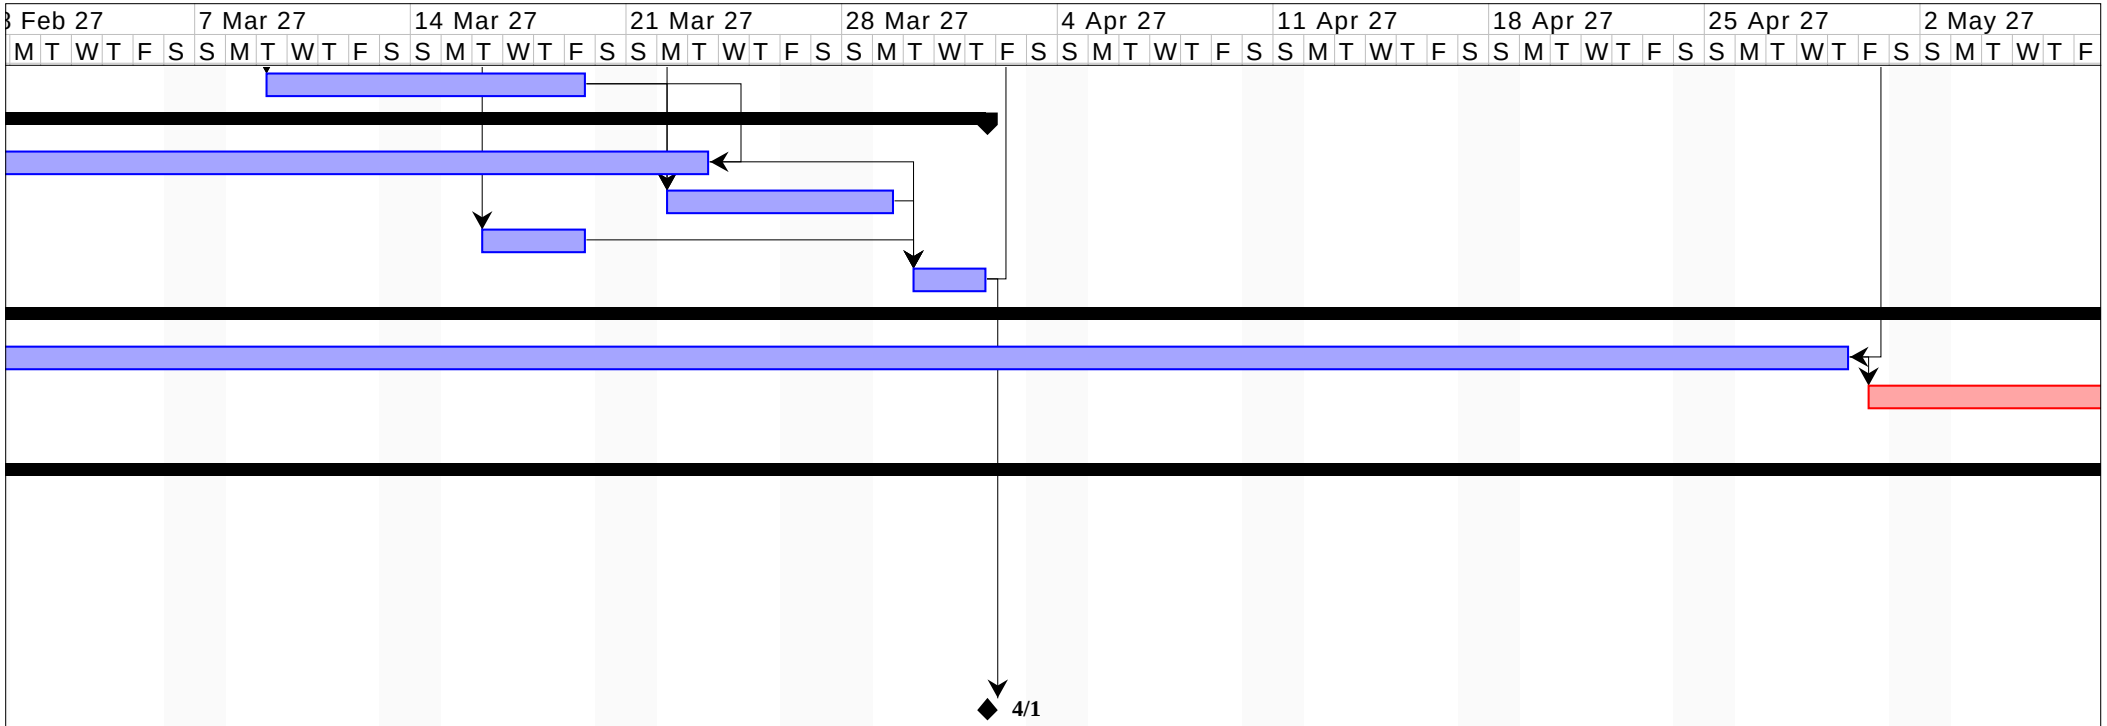

3 Feb 27
7 Mar 27
14 Mar 27
21 Mar 27
28 Mar 27
4 Apr 27
11 Apr 27
18 Apr 27
25 Apr 27
2 May 27
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
project.xml - page4

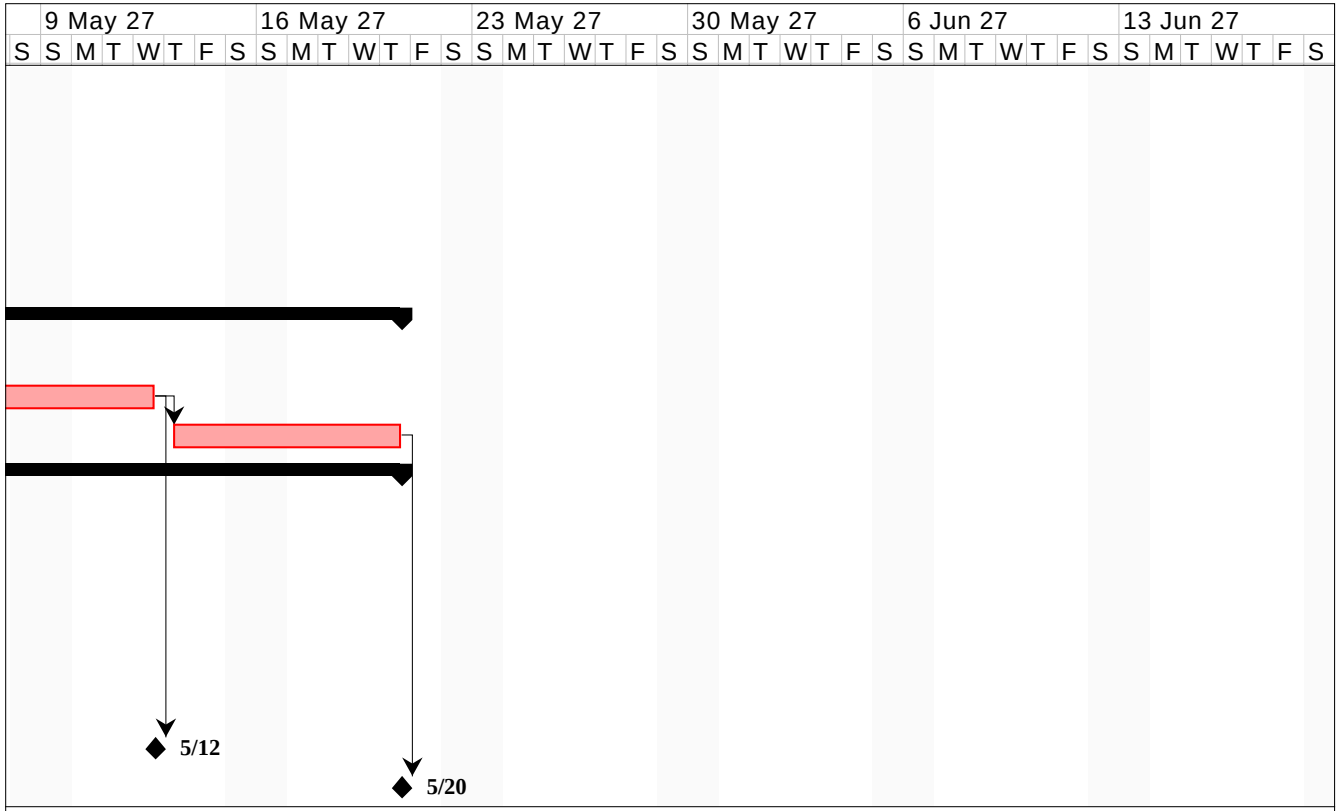

9 May 27
16 May 27
23 May 27
30 May 27
6 Jun 27
13 Jun 27
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	11 Oct 26 S M T W T
35		Funcionalidades ex...	9 days	3/9/27, 8:00AM	3/19/27, 5:00PM	32;33		
36		**Verificação e testes**	**27 days**	**2/23/27, 8:00AM**	**4/1/27, 5:00PM**			
37		Testes unitários e ...	21 days	2/23/27, 8:00AM	3/23/27, 5:00PM	32SS+3 days;35FF+2 ...		
38		Testes de integraç...	5 days	3/22/27, 8:00AM	3/29/27, 5:00PM	34;35		
39		Testes de âmbito ...	4 days	3/16/27, 8:00AM	3/19/27, 5:00PM	34		
40		Testes de aceitação	3 days	3/30/27, 8:00AM	4/1/27, 5:00PM	37;38;39		
41		**Dissertação**	**80 days**	**1/26/27, 8:00AM**	**5/20/27, 5:00PM**			
42		Documento da dis...	66 days	1/26/27, 8:00AM	4/29/27, 5:00PM	20SS;29FF+3 days		
43		Versão final subm...	8 days	4/30/27, 8:00AM	5/12/27, 5:00PM	42		
44		Apresentação da d...	6 days	5/13/27, 8:00AM	5/20/27, 5:00PM	43		
45		**Marcos**	**125 days**	**11/17/26, 5:00PM**	**5/20/27, 5:00PM**			
46		M1 Extended abstra...	0 days	11/17/26, 5:00PM	11/17/26, 5:00PM	6		
47		M2 Documento final ...	0 days	12/18/26, 5:00PM	12/18/26, 5:00PM	7		
48		M3 Pronto para a av...	0 days	12/28/26, 5:00PM	12/28/26, 5:00PM	8		
49		M4 Requisitos aprov...	0 days	1/27/27, 5:00PM	1/27/27, 5:00PM	18		
50		M5 Modelo escolhido	0 days	2/19/27, 5:00PM	2/19/27, 5:00PM	24		
51		M6 Assistente integr...	0 days	4/1/27, 5:00PM	4/1/27, 5:00PM	40		
52		M7 Dissertação sub...	0 days	5/12/27, 5:00PM	5/12/27, 5:00PM	43		
53		M8 Projeto concluído	0 days	5/20/27, 5:00PM	5/20/27, 5:00PM	44		


18 Oct 26
25 Oct 26
1 Nov 26
8 Nov 26
15 Nov 26
22 Nov 26
29 Nov 26
6 Dec 26
13 Dec 26
20 Dec
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
11/17
12/18


26
27 Dec 26
3 Jan 27
10 Jan 27
17 Jan 27
24 Jan 27
31 Jan 27
7 Feb 27
14 Feb 27
21 Feb 27
12/28
1/27
2/19


Feb 27
7 Mar 27
14 Mar 27
21 Mar 27
28 Mar 27
4 Apr 27
11 Apr 27
18 Apr 27
25 Apr 27
2 May 27
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
4/1


9 May 27
16 May 27
23 May 27
30 May 27
6 Jun 27
13 Jun 27
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
5/12
5/20
